



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br

ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/05/2026 a 30/06/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Objeto: Contratação de empresa de serviços especializados visando a execução de obras de equipamentos para reforma do Posto de Saúde da Vila Habitacional, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e projetos executivos.

Local: Rua Fiori Gigliotti, nº 365 – Bairro Vila Habitacional
Município: Estância Turística de Barra Bonita/SP

Contrato: A. PAULO PINTO ME
Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 90004/2026
Ordem de Serviço: 13 de maio de 2026

Prazo de Execução: 13/05/2026 a 13/05/2027 (12 meses)
Prazo Contratual: 06/05/2026 a 06/11/2027 (18 meses)

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

O presente relatório tem por finalidade apresentar o acompanhamento técnico da execução da obra no período de medição, evidenciando o andamento físico-financeiro, a conformidade dos serviços executados e o atendimento às condições contratuais.

3. SITUAÇÃO GERAL DA OBRA

Durante o período analisado, constatou-se que a obra se encontra em andamento regular, com execução compatível com o cronograma físico-financeiro estabelecido.

Não foram identificadas paralisações, interrupções ou inconformidades relevantes que comprometam o andamento da obra.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 Serviços Concluídos no Período

- Serviços preliminares (100% concluídos), incluindo instalação de placa de obra;
- Execução de fundações: escavação, brocas, armação, concretagem e lançamento (100%);
- Estrutura inicial executada conforme projeto;



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br

ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40

- Montagem de estrutura metálica da cobertura;
- Execução de telhamento metálico e cerâmico;
- Impermeabilização com manta asfáltica;
- Execução de abrigo com instalação de gradil e revestimentos;
- Execução completa das instalações elétricas;
- Pintura parcial (62% executada);
- Pintura em superfícies metálicas e pisos concluídas.

4.2 Serviços em Execução

- Pintura em látex em paredes internas e externas (em andamento – 62% executado);

4.3 Serviços Não Iniciados

- Demolições remanescentes;
- Remoção de entulho;
- Instalação de calhas e rufos;
- Estrutura metálica complementar;
- Esquadrias de vidro e soleiras.

5. ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Valor Total do Contrato: R\$ 103.000,00

Valor Medido no Período (1ª Medição): R\$ 42.989,76

Percentual Executado: 41,70%

Saldo Contratual: R\$ 60.010,24 (58,30%)

O avanço físico-financeiro encontra-se compatível com o cronograma previsto para o período.

6. QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços executados apresentam conformidade com os projetos executivos, especificações técnicas e normas vigentes, não sendo identificadas falhas relevantes até a presente medição.

Os materiais empregados estão de acordo com o previsto em contrato.

7. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da obra vem sendo realizada de forma contínua pela equipe técnica da Prefeitura, com acompanhamento das etapas executivas, medições e verificação da qualidade dos serviços.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br

ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40

8. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

A obra apresenta condições satisfatórias de segurança, com utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos trabalhadores, conforme exigências normativas.

9. OCORRÊNCIAS

Não foram registradas ocorrências relevantes, tais como paralisações, atrasos significativos ou intercorrências técnicas durante o período.

10. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a obra se encontra em andamento regular, dentro dos parâmetros contratuais, apresentando evolução física e financeira compatível com o cronograma estabelecido.

A execução atende às condições técnicas e legais, não havendo impedimentos para a continuidade dos serviços.

Estância Turística de Barra Bonita/SP, 11 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br DONIZETI BERNARDINO
Data: 11/06/2026 15:00:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DONIZETI BERNARDINO

Fiscal da Obra

Chefe do Departamento de Planejamento Urbano e Projetos
CREA/SP 5070554350



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br

ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Placa da Obra




motorola edge 50 neo



20 de mai. de 2020 11:12

Armação da Sapata da Cobertura

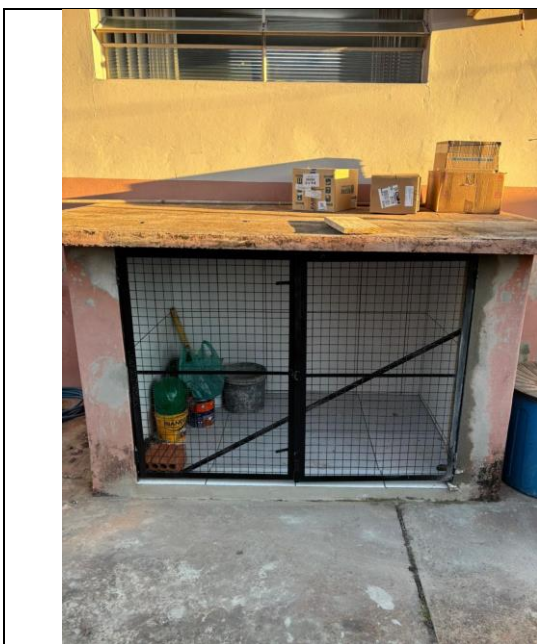

Reforma do Abrigo



Pintura da Estrutura de Madeira Telhado



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br

ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40



Pintura da Estrutura de Madeira Telhado



Pintura da Estrutura de Madeira Telhado



Pintura da Estrutura de Madeira Telhado



Pintura das Salas




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br

ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40

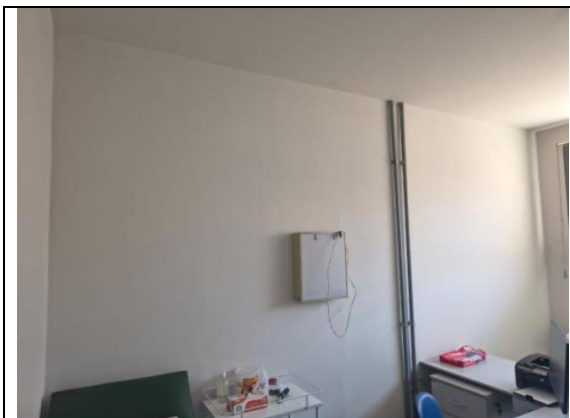

Pintura das Salas



Impermeabilização da Laje da Varanda



Impermeabilização da Laje da Varanda



Impermeabilização da Laje da Varanda



motorola edge 50 neo



8 de jun. de 2026 17:35

Cobertura da Escada da Entrada



motorola edge 50 neo



8 de jun. de 2026 14:39

Cobertura da Escada da Entrada



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000

Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br

ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40



motorola edge 50 neo



8 de jun. de 2026 17:34

Cobertura da Escada da Entrada



motorola edge 50 neo



8 de jun. de 2026 14:36

Cobertura da Escada da Entrada
