PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ: 46.172.888/0001-40

REGISTRO DE OBRAS – MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TRÍSTICA DE BARRA BONITA – SP

Obra: Construção Unidade Básica de Saúde – Porte I

Local: Rua Antônio Bressan, esquina com a Rua Arlindo Spaulonci e Rua Maria Casagrande Rizzato

Responsável Técnico: Engenheiro Paulo Sérgio de Jesus

Fiscal de Contrato: Engenheiro Donizeti Bernardino

Data de início: 11/04/2025

Previsão de conclusão: 11/04/2026

Previsão de conclusão com Aditivo de Prazo: 11/02/2027

Contratada: Neec Construtora Ltda

Número do contrato: 084/2025

Concorrência Eletrônica: 90002/2025

1. Registros:

29/05/2026 a 28/06/2026 – Alvenaria, Vedações e Divisórias (Alvenaria de Vedação); Alvenaria, Vedações e Divisórias (Drywall); Esquadrias (Esquadrias de Madeira); Revestimento de Piso Interno (Granilite); Revestimento de Piso Interno (Rodapé); Pintura (Paredes); Instalações Elétricas (Infraestrutura).

2. Medição / Acompanhamento

Período	Serviços Executados	Quantidade Executada	% de Execução do Item	Observações / Incidentes
29/05/2026 a 28/06/2026	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	120,96	100,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	18,47	50,00	
29/05/2026 a 28/06/2026	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	90,05	50,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA	42,23	50,00	-

	DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.			
29/05/2026 a 28/06/2026	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	33,02	50,00	
29/05/2026 a 28/06/2026	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	6,00	50,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:	5,00	50,00	-

	DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			
29/05/2026 a 28/06/2026	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	118,03	30,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	78,19	30,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1.039,23	50,00	
29/05/2026 a 28/06/2026	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	1,00	100,00	
29/05/2026 a 28/06/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	56,80	50,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	21,45	50,00	-

29/05/2026 a 28/06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	66,60	50,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	20,70	50,00	-
29/05/2026 a 28/06/2026	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	0,52	51,70	-

3. Controle Financeiro

Serviços	Valor Contratado	Valor Medido	Valor Pago	Saldo	Observações
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 147.489,11	R$ 0,00	R$ 113.848,62	R$ 33.640,49	

CANTEIRO DE OBRAS	R$ 77.737,95	R$ 0,00	R$ 69.739,07	R$ 7.998,88	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 51.337,76	R$ 0,00	R$ 30.802,66	R$ 20.535,10	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 7.119,15	R$ 0,00	R$ 4.271,49	R$ 2.847,66	
EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 11.294,25	R$ 0,00	R$ 9.035,40	R$ 2.258,85	
FUNDAÇÃO	R$ 231.515,00	R$ 0,00	R$ 231.515,00	R$ 0,00	
ESTRUTURA	R$ 300.331,80	R$ 0,00	R$ 298.387,61	R$ 1.944,19	
PILARES	R$ 68.150,25	R$ 0,00	R$ 68.150,25	R$ 0,00	
VIGAS	R$ 117.524,57	R$ 0,00	R$ 117.524,57	R$ 0,00	
LAJES	R$ 112.712,79	R$ 0,00	R$ 112.712,79	R$ 0,00	
BASE RESERVATÓRIO	R$ 1.944,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,19	

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 191.422,66	R$ 62.061,23	R$ 158.890,54	R$ 32.532,12	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	126.422,68	R$ 29.593,36	R$ 126.422,68	R$ 0,00	
DRYWALL	R$ 64.935,73	R$ 32.467,87	R$ 32.467,87	R$ 32.467,86	
DIVISÓRIAS	R$ 64,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,25	
COBERTURA	R$ 84.049,60	R$ 0,00	R$ 70.525,66	R$ 13.523,94	
ESTRUTURA	R$ 35.696,73	R$ 0,00	R$ 25.773,29	R$ 9.923,44	
TELHAMENTO	R$ 26.272,09	R$ 0,00	R$ 22.671,58	R$ 3.600,51	
COMPLEMENTOS	R$ 22.080,78	R$ 0,00	R$ 22.080,78	R$ 0,00	
IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 16.769,75	R$ 0,00	R$ 16.769,75	R$ 0,00	
ESQUADRIAS	R$ 220.158,30	R$ 17.496,28	R$ 72.196,20	R$ 147.962,10	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 17.496,28	R$ 17.496,28	R$ 34.255,09	

PORTAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 17.496,28	R$ 17.496,28	R$ 34.255,09	
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 114.316,67	R$ 0,00	R$ 54.699,92	R$ 59.616,75	
PORTAS DE ALUMÍNIO	R$ 59.616,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.616,75	
JANELAS DE ALUMÍNIO	R$ 54.699,92	R$ 0,00	R$ 54.699,92	R$ 0,00	
ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
PORTAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
ACESSÓRIOS	R$ 51.656,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.656,25	
REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 78.241,93	R$ 0,00	R$ 62.496,25	R$ 15.745,68	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 65.785,53	R$ 0,00	R$ 62.496,25	R$ 3.289,28	
REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 12.456,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.456,40	

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 97.391,45	R$ 12.785,02	R$ 88.868,11	R$ 8.523,34	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 54.774,72	R$ 0,00	R$ 54.774,72	R$ 0,00	
GRANILITE	R$ 36.306,64	R$ 10.891,99	R$ 29.045,31	R$ 7.261,33	
RODAPÉ	R$ 6.310,09	R$ 1.893,03	R$ 5.048,08	R$ 1.262,01	
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO DE TETO	R$ 35.907,02	R$ 0,00	R$ 251,48	R$ 35.655,54	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 251,48	R$ 0,00	R$ 251,48	R$ 0,00	
FORRO	R$ 35.655,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.655,54	
PINTURA	R$ 89.733,11	R$ 6.619,90	R$ 6.619,90	R$ 83.113,21	

PAREDES	R$ 68.869,40	R$ 6.619,90	R$ 6.619,90	R$ 62.249,50	
TETO	R$ 16.989,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.989,38	
ESQUADRIAS	R$ 3.874,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.874,33	
MARMORARIA	R$ 10.595,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.595,36	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 53.707,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.707,57	
EQUIPAMENTOS	R$ 246,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,16	
LOUÇAS	R$ 14.299,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.299,75	
METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 39.161,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.161,66	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 135.465,49	R$ 0,00	R$ 58.699,53	R$ 76.765,96	
HIDRÁULICA	R$ 59.878,01	R$ 0,00	R$ 17.806,05	R$ 42.071,96	
SANITÁRIA	R$ 47.206,55	R$ 0,00	R$ 21.021,57	R$ 26.184,98	
PLUVIAL	R$ 21.182,23	R$ 0,00	R$ 19.871,91	R$ 1.310,32	

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R$ 7.198,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.198,70	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 236.673,02	R$ 7.561,87	R$ 82.516,12	R$ 154.156,90	
INFRAESTRUTURA	R$ 168.547,18	R$ 7.561,87	R$ 56.843,48	R$ 111.703,70	
ILUMINAÇÃO	R$ 28.941,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.941,93	
SPDA	R$ 39.183,91	R$ 0,00	R$ 25.672,64	R$ 13.511,27	
CLIMATIZAÇÃO	R$ 105.752,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.752,22	
INFRAESTRUTURA	R$ 78.173,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.173,91	
EQUIPAMENTOS	R$ 27.578,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.578,31	
DADOS E VOZ	R$ 9.323,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,76	
GASES MEDICINAIS	R$ 16.230,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.230,21	
URBANIZAÇÃO	R$ 6.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.186,08	

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R$ 2.924,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.924,86	
PAISAGISMO	R$ 1.983,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,92	
SINALIZAÇÃO	R$ 1.277,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.277,60	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.400,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,61	
TOTAL GERAL	R$ 2.089.065,93	R$ 106.524,30	R$ 1.261.584,77	R$ 827.481,16	

4. Ocorrências / Observações Gerais

- Não houve ocorrências

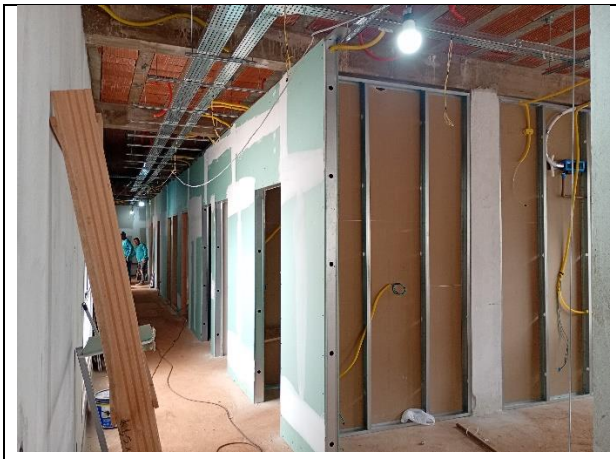
5. Assinaturas

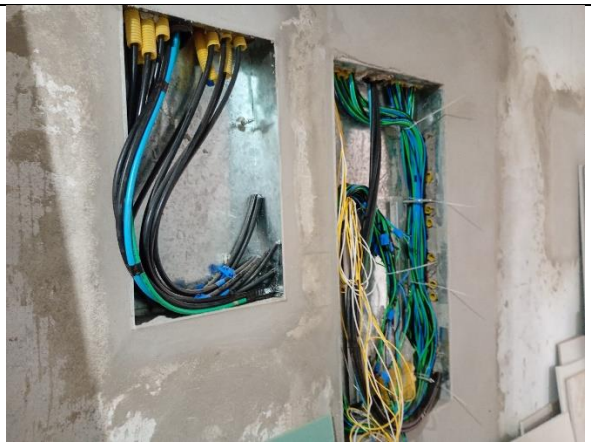
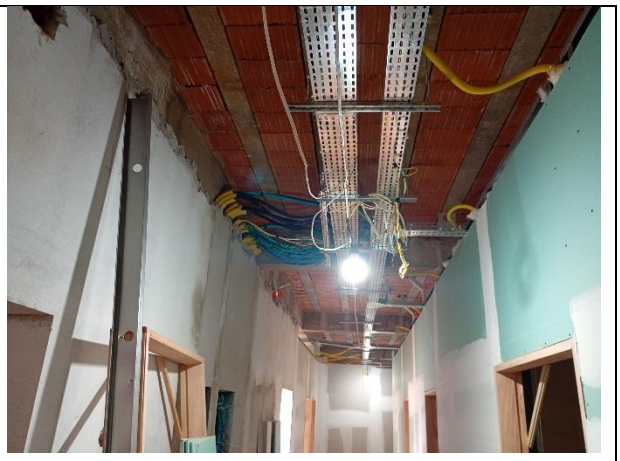
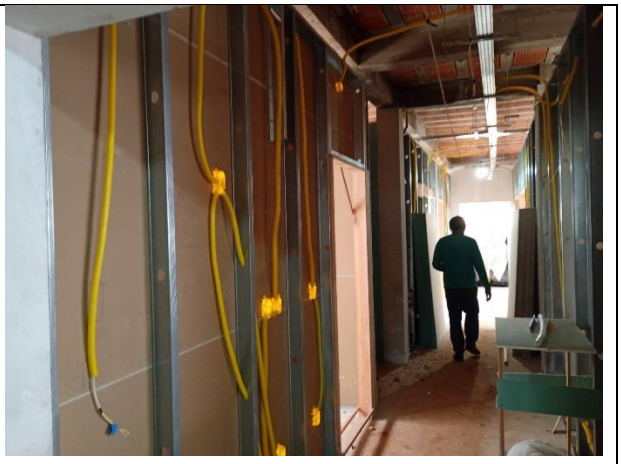
gov.br Documento assinado digitalmente
DONIZETI BERNARDINO
Data: 03/08/2026 16:17:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Donizeti Bernardino
Chefe do Departamento de Planejamento Urbano e Projetos
Fiscal de Contrato
CREA/SP 5070554350

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ. 46.172.888/0001-40

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

	
PISO - JUNHO/2026	PISO - JUNHO/2026
	
DRYWALL - MAIO /2026	ELÉTRICA E DRYWALL - JUNHO/2026
	
DRYWALL - JUNHO/2026	DRYWALL - JUNHO/2026

	
ELÉTRICA – JUNHO/2026	ELÉTRICA – JUNHO/2026
	
ELÉTRICA – JUNHO/2026	GRANILITE – JUNHO/2026
	
REVESTIMENTO PAREDE – JUNHO/2026	ELÉTRICA E DRYWALL – JUNHO/2026
